# SportZone
# Plan de Desarrollo de Software
**Version 1.0**

# Historial de Revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor/es |
|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | 1.0 | Versión inicial del documento. Se completaron las secciones: 1. Introducción (subsecciones 1.1 a 1.5) y 2. Descripción del Proyecto (2.1 y 2.2). | Elías U. Gonzalez, José I. Leguizamón, Elías D. Yapura |
| | 1.0 | Se revisaron las secciones Introducción (subsecciones 1.1 a 1.5) y 2. Descripción del Proyecto (2.1 y 2.2). | Diaz Miriam |
| 9/05/2025 | 1.0 | Se completaron las secciones 4.1 Estimaciones del Proyecto y 4.2 Plan de Proyecto | Elías U. Gonzalez, José I. Leguizamón, Elías D. Yapura |
| 17-05-2025 | 1.0 | Se revisaron las secciones 4.1 Estimaciones del Proyecto y 4.2 Plan de Proyecto | Diaz Miriam |
| 31/06/2025 | 1.0 | Se corrigieron las secciones 4.1 Estimaciones del Proyecto y 4.2 Plan de Proyecto. También se desarrollaron las secciones faltantes | Elías U. Gonzalez, José I. Leguizamón, Elías D. Yapura |
| 06/06/2025 | 1.0 | Se revisaron las secciones que faltaban | Diaz Miriam |
| 08/06/2025 | 1.0 | Se incluyeron las secciones 2.5 Gestión de Requisitos. y 4.5 Reportes y Métricas. Se eliminó la sección 4.4 Estimaciones. | Elías U. Gonzalez, José I. Leguizamón, Elías D. Yapura |


©SportZone 5/8/25

# Tabla de Contenidos


**1. Introducción** ..... 4
1.1 Propósito ..... 4
1.2 Alcance ..... 4
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones ..... 4
1.4 Referencias ..... 4
1.5 Resumen General ..... 4
**2. Descripción del Proyecto** ..... 5
2.1 Propósito, Alcance y Objetivos del Proyecto ..... 5
2.2 Supuestos y Restricciones ..... **Error! No bookmark name given.**
2.3 Entregables ..... 6
2.4 Evolución del Plan de Desarrollo de Software ..... 6
2.5 Gestión de Requisitos ..... 7
**3. Organización del Proyecto** ..... 7
3.1 Estructura Organizativa ..... 7
3.2 Interfaces Externas ..... 7
3.3 Roles y Responsabilidades ..... 8
**4. Proceso de Gestión** ..... 8
4.1 Estimaciones del Proyecto ..... 8
4.2 Plan del Proyecto ..... 10
4.3 Monitoreo y Control del Proyecto ..... 12
4.4 Control de Calidad ..... 13
4.5 Reportes y Métricas ..... 13
4.6 Gestión de Riesgos ..... 13
4.7 Gestión de las Configuraciones ..... 14
**5. Anexos** ..... 15




©SportZone 5/8/25

# Plan de Desarrollo de Software

## 1. Introducción

Este Plan de Desarrollo de Software para el proyecto SportZone tiene como objetivo organizar y guiar el trabajo del equipo durante todo el proceso de desarrollo del sistema. Define cómo se planificará, ejecutarán y controlarán las tareas en las diferentes etapas del proyecto, desde la definición de requisitos hasta la entrega final del producto.

El documento sirve como referencia general para coordinar roles, establecer prioridades, gestionar riesgos y asegurar que el sistema cumpla con los objetivos técnicos y funcionales, respetando los tiempos y recursos disponibles.

### 1.1 Propósito

El propósito de este Plan de Desarrollo de Software es definir cómo se organizará y gestionarán las actividades necesarias para desarrollar el sistema SportZone. Este plan proporciona una guía estructurada para coordinar al equipo de trabajo, asignar responsabilidades, establecer cronogramas y controlar riesgos, calidad y entregables. Su aplicación permitirá asegurar que el producto final se entregue a tiempo, cumpla con los requisitos establecidos y sea técnicamente viable.

### 1.2 Alcance

Este plan abarca todos los aspectos de la gestión del proyecto SportZone, incluyendo la planificación, seguimiento y control de actividades, definición de roles, procedimientos de validación, herramientas a emplear y cronogramas de trabajo. No incluye la descripción funcional detallada del sistema, la cual se encuentra en el documento de especificación de requerimientos.

### 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

A continuación, se presentan algunas definiciones y acrónimos utilizados en este documento:

- **CMS**: Content Management System – Sistema de gestión de contenidos.
- **UX**: User Experience – Experiencia del usuario.
- **UI**: User Interface – Interfaz de usuario.
- **SPMP**: Software Project Management Plan – Plan de Gestión de Proyecto de Software.
- **WBS**: Work Breakdown Structure – Estructura de Desglose del Trabajo.

Para más términos, se puede consultar el Glosario del Proyecto si corresponde.

### 1.4 Referencias

A continuación, se enumeran los documentos y materiales de referencia utilizados para la elaboración de este Plan de Desarrollo de Software:

- **Especificación de Requerimientos del Software – SportZone**
  Documento que define los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- **Guía PMBOK – Project Management Body of Knowledge**
  Referencia para prácticas de gestión de proyectos de software.
- **Material de cátedra: Gestión de Proyectos de Software – Unidad 2 (Parte I y II)**
  Documentación proporcionada por las profesoras Gabriela Miranda y Miriam Diaz.
- **Plantilla UPEDU – Unified Process for EDUcation**
  Estructura base utilizada para la redacción formal del plan.

### 1.5 Resumen General

Este Plan de Desarrollo de Software contiene la información principal para la planificación, ejecución y control del proyecto SportZone. Está estructurado en las siguientes secciones:

- **Descripción del proyecto:** incluye el propósito, el alcance y los objetivos generales, así como los entregables esperados.


©SportZone 5/8/25

- **Organización del proyecto:** describe cómo se estructura el equipo de trabajo, los roles asignados y las interfaces externas.
- **Proceso de gestión:** detalla estimaciones, cronograma, control de calidad, riesgos, métricas y procedimientos de seguimiento.
- **Planes aplicables:** incluye las herramientas, metodologías y procesos que se utilizarán durante el desarrollo.

Este documento servirá como guía de referencia para todos los integrantes del equipo, permitiendo alinear el trabajo con los objetivos y restricciones definidos para el proyecto.

## 2. Descripción del Proyecto

### 2.1 Propósito, Alcance y Objetivos del Proyecto

El propósito del proyecto SportZone es desarrollar una tienda online funcional para la venta de artículos deportivos, que incluye productos como indumentaria, calzado y accesorios. El sistema está orientado a facilitar la experiencia de compra del usuario, asegurar pagos seguros e integrar una interfaz de administración eficiente para la gestión del negocio.

**Alcance:**

El proyecto incluye el diseño, implementación y despliegue de una plataforma web basada en WordPress y WooCommerce, con las siguientes funcionalidades:

- Visualización y navegación de productos por categorías.
- Gestión de carrito de compras y proceso de pago.
- Registro y autenticación de usuarios.
- Panel de administración para gestionar productos, inventario y pedidos.
- Generación de reportes básicos de ventas e inventario.

**Objetivos:**

- Desarrollar una interfaz clara y responsive para los usuarios finales.
- Integrar pasarelas de pago confiables como Mercado Pago.
- Permitir la administración eficiente del contenido desde el backend.
- Publicar una versión operativa del sitio antes del cierre del ciclo académico.
- Asegurar el cumplimiento de requisitos funcionales y no funcionales definidos previamente.

### 2.2 Supuestos y Restricciones

**Supuestos:**

- El equipo de desarrollo posee conocimientos previos en WordPress, WooCommerce y herramientas básicas de diseño y maquetación web.
- El sitio se desarrollará inicialmente en un entorno local o de prueba, y se migrará a un hosting en línea más adelante.
- El contenido inicial (productos, imágenes, descripciones y categorías) será provisto o simulado por el equipo.
- Las pasarelas de pago seleccionadas (Mercado Pago) funcionarán correctamente en sus entornos de prueba durante el desarrollo.
- El usuario administrador tendrá conocimientos básicos para operar el panel de control del sistema.
- Se utilizará Click Up (versión gratuita) como herramienta de gestión y seguimiento de tareas del proyecto.

**Restricciones:**

- El desarrollo debe completarse dentro del cuatrimestre académico actual.
- Se priorizará el uso de recursos gratuitos disponibles. En caso de ser necesario y viable, se podrá incorporar algún servicio pago (como hosting o herramientas complementarias).

- El sistema deberá funcionar correctamente en los principales navegadores web (Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge), aunque se para evitar errores de visualización y plugins, se recomienda el uso de Microsoft Edge.
- El diseño del sitio deberá estar adaptado para dispositivos móviles.
- El número de productos cargados en la versión inicial será limitado, con fines de prueba demostración y validación funcional.

### 2.3 Entregables

A continuación, se detallan los principales entregables del proyecto, los cuales se desarrollarán de forma iterativa durante los distintos sprints definidos en el cronograma.

| **Entregable** | **Descripción** | **Sprint estimado** |
| --- | --- | --- |
| Documento de Planificación | Plan de Desarrollo de Software, estimaciones, cronograma y gestión de riesgos. | Sprint 1 |
| Prototipo visual (mockups) | Diseño de las principales pantallas del sistema (home, catálogo, login, carrito, etc.). | Sprint 1 |
| Catálogo funcional | Navegación por productos y categorías con datos simulados. | Sprint 2 |
| Sistema de autenticación | Registro, inicio de sesión y validación de usuarios. | Sprint 3 |
| Carrito de compras | Funcionalidades básicas del carrito con control de cantidades y subtotales. | Sprint 3 |
| Integración de pasarelas de pago | Configuración de Mercado Pago en modo sandbox. | Sprint 4 |
| Panel de administración | Gestión de productos, usuarios y pedidos | Sprint 4 |
| Pruebas funcionales e integradas | Casos de prueba ejecutados sobre funcionalidades clave. | Sprint 5 |
| Documentación técnica y manual de usuario | Guía de uso, despliegue y administración del sistema. | Sprint 5 |
| Despliegue del sistema | Versión funcional alojada en un hosting en línea. | Sprint 5 |

**Tabla 1.** Entregables del proyecto y Sprint estimado

### 2.4 Evolución del Plan de Desarrollo de Software

Este plan fue concebido como un documento vivo y adaptable, que evolucionará a medida que avance el proyecto. Su estructura está alineada con la metodología iterativa adoptada, permitiendo incorporar mejoras, ajustes y nuevos lineamientos según las necesidades detectadas durante los sprints.

Las principales condiciones para la actualización del plan son:

- Cambios en los requerimientos funcionales o no funcionales.
- Ajustes en los recursos disponibles (tiempo, herramientas, equipo).
- Retroalimentación docente.
- Resultados obtenidos tras las revisiones de sprint.

### 2.5 Gestión de Requisitos

La gestión de requisitos del proyecto SportZone se realiza desde la etapa inicial del desarrollo, con base en el documento de Especificación de Requerimientos del Software. Se aplican las siguientes prácticas:

- Revisión inicial con los docentes para validación de requisitos funcionales y no funcionales.
- Registro en la herramienta Click Up de cada requisito como tarea o subtarea.
- Priorización de funcionalidades por impacto y complejidad.
- Validación incremental durante los sprints.
- Ajustes según feedback recibido durante las entregas intermedias.

Esta estrategia permite mantener la trazabilidad y adaptación del sistema a los objetivos académicos.

## 3. Organización del Proyecto

Esta sección describe la forma en que se encuentra organizado el equipo de desarrollo del sistema SportZone, identificando tanto la estructura interna del equipo como las interacciones externas necesarias durante el ciclo de vida del proyecto. También se detallan los roles asignados y las responsabilidades de cada miembro.

### 3.1 Estructura Organizativa

El equipo de desarrollo del proyecto SportZone adopta una estructura organizativa horizontal, colaborativa y centrada en la metodología ágil. Dado que el sistema se construye sobre la plataforma WordPress con integración de WooCommerce, las tareas se distribuyen considerando tanto habilidades técnicas como organizativas relacionadas con la personalización de CMS, diseño web y gestión de contenido.

Se emplea la herramienta Click Up como plataforma principal para la planificación de tareas, seguimiento del progreso y registro de actividades. Las decisiones estratégicas y técnicas se definen en conjunto mediante reuniones periódicas de revisión y planificación.

### 3.2 Interfaces Externas

Durante el desarrollo del sistema se identifican los siguientes agentes externos con los cuales el equipo debe interactuar directa o indirectamente:

| Entidad Externa | Tipo de Interfaz | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Docentes | Revisión y Orientación | Supervisión académica, validación del proyecto y retroalimentación periódica. |
| Wordpress + Woocommerce | Plataforma de Desarrollo | CMS y plugin de comercio electrónico que constituyen la base técnica del sistema. |
| Pasarelas de Pago | Servicios Externos | Se utilizarán plugins para integrar métodos de pago simulados. |
| Click Up | Herramienta de Gestión | Utilizada para planificar, asignar |

| | | |
|---|---|---|
| | | tareas, registrar avances y gestionar el equipo. |

**Tabla 2.** Interfaces externas del sistema

### 3.3 Roles y Responsabilidades

A continuación, se describen los roles asignados dentro del equipo de desarrollo, teniendo en cuenta las necesidades propias del trabajo con WordPress y WooCommerce:

- **Coordinador del Proyecto**

  Responsable: José I. Leguizamón

  Responsabilidades: Coordinar al equipo de trabajo, planificar los sprints, gestionar el cronograma, comunicar avances a los docentes, y asegurar el cumplimiento de los objetivos y tiempos establecidos.

- **Especialista en WordPress y WooCommerce**

  Responsable: Elías U. González

  Responsabilidades: Configurar y personalizar la instalación de WordPress, integrar el plugin WooCommerce, gestionar plugins adicionales (como pasarelas de pago), y resolver aspectos técnicos del CMS.

- **Diseñador UX/UI y Maquetador**

  Responsable: Elías D. Yapura

  Responsabilidades: Diseñar los prototipos visuales en herramientas como Figma, adaptar plugins y temas de WordPress, garantizar la navegabilidad del sitio y su correcta visualización en varios dispositivos.

## 4. Proceso de Gestión

### 4.1 Estimaciones del Proyecto

El proyecto SportZone fue estimado utilizando dos métodos complementarios: el análisis de Puntos de Función Ajustados (PFA) y el modelo algorítmico COCOMO 81. Esto permite obtener una visión más completa y fiable del tamaño, esfuerzo, duración y costo del desarrollo.

**Estimación mediante Puntos de Función (FPA)**

Se identificaron los componentes funcionales del sistema según la técnica Function Point Analysis (FPA), asignando complejidad media a cada uno por tratarse de una aplicación web de complejidad moderada.

| Tipo de Función | Descripción | Cantidad | Complejidad | PF por Item | Subtotal PF |
|---|---|---|---|---|---|
| Entradas Externas (EI) | Registro, edición y eliminación de datos | 5 | Media | 4 | 20 |
| Consultas Externas (EQ) | Búsquedas por categoría y palabra clave | 3 | Media | 4 | 12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Salidas Externas (EO) | Listados y reportes | 3 | Media | 5 | 15 |
| Archivos Lógicos Internos (ILF) | Tablas del sistema | 11 | Media | 7 | 77 |
| Archivos de Interfaces Externos (EIF) | Pasarela de pagos externa | 1 | Media | 5 | 5 |
| **TOTAL** | | 22 | | | 129 |

**Tabla 3**. Estimación mediante Puntos de Función

La identificación de los componentes funcionales (Entradas, Salidas, Consultas, Archivos Lógicos Internos) se realizó a partir del análisis de las entidades del sistema, detalladas en los anexos técnicos:

- "Estructuras de Tablas y Modelado de Datos – SportZone".
- "Puntos de Función - SportZone".

Total de Puntos de Función Sin Ajustar (PFSA): 129

Se aplica el Factor de Ajuste de Complejidad (FAC), calculado como:

- $FAC = 0.65 + (0.01 \times \Sigma Fi) = 0.65 + 0.35 = 1.00$
- $PFA = 129 \times 1.00 = 129$

**Estimación de Tamaño**

Para aplicar el modelo COCOMO, es necesario convertir los PFA a KLOC, utilizando un factor promedio de 30 líneas de código por punto de función:

- $129 \text{ PFA} \times 30 = 3870 \text{ LDC} = 3.87 \text{ KLOC}$

**Estimación de Esfuerzo**

Esto representa la cantidad total de trabajo estimada en persona - mes, considerando una dedicación completa (160 horas/mes):

- $PM = 2.4 \times (3.87)^{1,05} \approx 10.27$ persona-mes

**Estimación de la Duración**

Este valor representa la duración esperada del proyecto si el esfuerzo estimado se distribuye adecuadamente entre los integrantes del equipo:

- $TDEV = 2.5 \times (10.27)^{0,38} \approx 6.31$ meses

**Estimación del costo**

Para calcular el costo total del proyecto, se consideró un sueldo mensual estimado para un desarrollador junior en Argentina de $1.492.998,88 ARS:

- Costo = 10.27 x 1.492.998,88 ≈ $15.341.018 ARS


©SportZone 5/8/25

### 4.2 Plan del Proyecto

El desarrollo del sistema de SportZone se organiza mediante metodologías ágiles, utilizando 5 Sprints como ciclos iterativos de planificación, implementación, revisión y mejora..

- Inicio del proyecto: 31/03/2025
- Finalización estimada: 10/10/2025

**Representación Visual de la WBS**

La planificación del proyecto se estructuró utilizando una estrategia iterativa compuesta por sprints. A continuación, se presenta la Work Breakdown Structure (WBS) en formato visual, desglosando el proyecto en entregables por sprint:

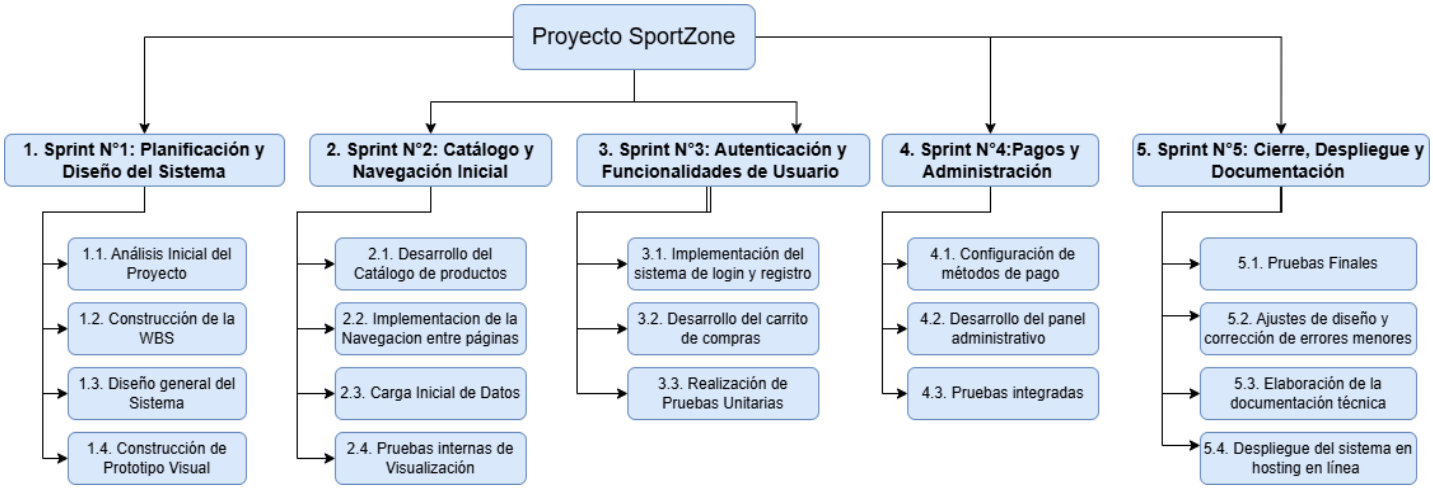


**Imagen 1**. Representación Visual de la WBS

**Cronograma de Actividades**

- **Sprint 1 (Planificación y Diseño del Sistema)**

**Duración: 31/03/2025 - 26/04/2025**

Durante este primer sprint se sentarán las bases del proyecto. Las actividades se centrarán en:

- **Análisis inicial del proyecto**, donde se revisan los requerimientos funcionales y no funcionales definidos en el documento de especificación. Se validan supuestos clave como el uso de WordPress y WooCommerce, y se delimitan los recursos disponibles.

- **Construcción de la WBS (Work Breakdown Structure)**, desglosando todas las tareas en entregables concretos, lo que permitirá una gestión más efectiva del alcance y del cronograma.

- **Diseño general del sistema**, que abarca tanto la arquitectura del sitio como los esquemas básicos de bases de datos (productos, usuarios, pedidos).

- **Prototipo visual** mediante la herramienta Figma, incluyendo los primeros mockups de las páginas principales: home, catálogo, login, y carrito.

Este sprint tiene como objetivo establecer una visión compartida del producto y sentar las bases para las etapas de desarrollo siguientes.

- **Sprint 2 (Catálogo y Navegación Inicial)**

**Duración: 27/04/2025 - 22/05/2025**

Este sprint se enfoca en la funcionalidad básica de exploración de productos:

- **Desarrollo del catálogo de productos**, que incluye la configuración de categorías, subcategorías y fichas de producto dentro de WooCommerce.
- **Implementación de la navegación básica** entre páginas (menú, enlaces, entre otros) asegurando coherencia en la experiencia de usuario.
- **Carga inicial de datos**, con productos de prueba (simulados por el equipo) incluyendo imágenes, descripciones y precios.
- Se harán **pruebas internas de visualización** en distintos dispositivos y navegadores para validar el diseño responsive.

Este sprint es crucial para entregar una primera versión navegable del sistema, que permita validar el diseño y flujo de usuario inicial.

- **Sprint 3 (Autenticación y Funcionalidades de Usuario)**

**Duración: 23/05/2025 – 17/06/2025**

Se incorporan las funcionalidades centradas en el usuario:

- **Implementación del sistema de login y registro**, utilizando las funcionalidades nativas de WordPress extendidas si es necesario con plugins de seguridad.
- **Desarrollo del carrito de compras**, con funcionalidades como agregar, eliminar y modificar productos, cálculo de subtotal y validaciones básicas.
- **Pruebas unitarias** para asegurar la correcta gestión de sesiones de usuario, validación de datos y experiencia segura.

Este sprint permite habilitar la interacción personalizada y es un paso clave hacia una tienda funcional.

- **Sprint 4 (Pagos y Administración)**

**Duración: 18/06/2025 – 13/07/2025**

Este sprint se dedica a conectar el front-end con las operaciones clave del negocio:

- **Configuración de métodos de pago**, integrando pasarelas como Mercado Pago en modo sandbox, asegurando la compatibilidad con WooCommerce.

- **Desarrollo del panel administrativo**, habilitando al administrador la carga, edición y eliminación de productos, así como la gestión de pedidos y usuarios.

- **Pruebas integradas**, para verificar el flujo completo de compra, desde la selección de productos hasta el pago y confirmación.

Este sprint marca el paso a un sistema funcionalmente completo, apto para validación integral.

- **Sprint 5 (Cierre, Despliegue y Documentación)**

**Duración: 5 semanas 14/07/2025 - 10/10/2025**

La última iteración incluye las tareas necesarias para la entrega del producto final:

- **Pruebas finales**, tanto funcionales como de experiencia de usuario, ejecutando casos de prueba definidos previamente.

- **Ajustes de diseño y corrección de errores menores**, surgidos de pruebas o feedback de revisión.

- **Elaboración de la documentación técnica**, incluyendo manual de usuario administrador, informe final y guía de despliegue.

- **Despliegue del sistema en hosting en línea**, incluyendo la migración desde el entorno local y verificación post-despliegue.

El objetivo final es dejar la tienda operativa, documentada y accesible para su presentación y evaluación.

### 4.3 Monitoreo y Control del Proyecto

El seguimiento y control de SportZone se lleva a cabo de forma continua a lo largo de todos los sprints. Para ello, se implementa una estrategia de monitoreo basada en reuniones de planificación, control de avance en la herramienta Click Up, y revisiones de sprint al finalizar cada iteración.

Las principales actividades de monitoreo incluyen:

- Revisión semanal del avance, identificando tareas completadas, pendientes o bloqueadas.
- Gestión visual del progreso mediante tableros de tareas (Kanban).
- Actualización de prioridades en función del feedback recibido y las necesidades del sistema.
- Evaluación de tiempos de ejecución y cumplimiento de los objetivos por sprint.

Este enfoque permite realizar ajustes ágiles en el plan, redistribuir tareas según la disponibilidad y anticiparse a posibles desviaciones en el cronograma o entregables.

### 4.4 Control de Calidad

El control de calidad del sistema SportZone se aborda en dos niveles:

- Calidad del producto: se verifican las funcionalidades clave del sistema (catálogo, autenticación, pagos, administración) mediante pruebas manuales, priorizando la usabilidad, navegación y seguridad.
- Calidad del proceso: se controla que cada etapa del desarrollo cumpla con los entregables definidos, se documente adecuadamente, y se valide mediante revisiones de sprint con todo el equipo.

Se utilizarán los siguientes métodos de aseguramiento de calidad:

- Pruebas funcionales e integradas, incluyendo casos de prueba diseñados para cada módulo.
- Verificación cruzada entre miembros del equipo antes de finalizar cada tarea.
- Corrección continua de errores a partir del feedback interno y docente.
- Validación de diseño responsive, accesibilidad y compatibilidad en diferentes navegadores.

### 4.5 Reportes y Métricas

El control del progreso del proyecto SportZone se realiza mediante métricas de seguimiento continuo en la herramienta Click Up, complementadas por reuniones periódicas del equipo. Las métricas principales que se monitorean son:

- Porcentaje de avance por sprint, medido según tareas completadas vs. planificadas.
- Cantidad de tareas bloqueadas, para identificar cuellos de botella.
- Tiempos de ejecución real vs. planificada, para evaluar eficiencia y detectar desviaciones.
- Número de errores reportados por funcionalidad, como medida de calidad técnica.

Estos datos permiten tomar decisiones informadas para planificar actividades, redistribuir tareas o reforzar módulos críticos según su desempeño.

### 4.6 Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos del proyecto SportZone se documenta de manera detallada en un informe independiente titulado "Lista de Riesgos – SportZone", el cual forma parte de los documentos anexos del proyecto.
Dicho documento identifica, analiza y propone estrategias de mitigación y planes de contingencia para los principales riesgos técnicos, organizativos y operativos asociados al desarrollo del sistema. Entre los riesgos más relevantes se destacan:

- Falta de experiencia en WordPress y WooCommerce.
- Sobrecarga académica del equipo.
- Fallos en la integración de pasarelas de pago.


©SportZone 5/8/25

- Problemas de diseño responsive en dispositivos móviles.
- Cambios en los requerimientos durante el proyecto.

Cada riesgo está documentado con su magnitud, impactos potenciales, indicadores, estrategia de mitigación y plan de contingencia correspondiente.
Para más información, consultar el documento anexo “Lista de Riesgos – SportZone”.

### 4.7 Gestión de las Configuraciones

La gestión de la configuración del sistema SportZone se llevó a cabo mediante el uso de herramientas específicas orientadas a entornos WordPress, con el objetivo de garantizar el control, la trazabilidad y la integridad de todos los componentes del sistema durante el desarrollo.
Se implementó una estrategia basada en las siguientes herramientas:

- Main WP: Se utilizó como panel centralizado para la administración remota de las configuraciones del sitio. Esta plataforma permite gestionar múltiples aspectos del entorno WordPress desde un único panel, incluyendo:
    - Actualización y monitoreo de plugins y temas.
    - Verificación del estado del sistema en tiempo real.
    - Automatización de tareas de mantenimiento.
- UpdraftPlus: Como complemento de respaldo y restauración, se empleó este plugin para realizar copias de seguridad completas del sitio antes de cada entrega significativa (por sprint o línea base). Entre sus funcionalidades destacadas:
    - Programación automática de backups.
    - Restauración rápida del estado funcional del sistema.
    - Almacenamiento de copias en la nube (Google Drive).
    - Integración con MainWP para el control remoto de los respaldos.
- Control de versiones y respaldos: Se aplicó una política de generación de respaldos antes de cada sprint, con el fin de preservar versiones estables del sistema. Esto permitió mantener un historial de configuraciones y facilitar la recuperación ante errores o fallas.

Estas herramientas permitieron implementar una gestión activa del entorno de desarrollo y producción, contribuyendo a la estabilidad del sistema, reduciendo riesgos de pérdida de información, y asegurando la trazabilidad de los cambios durante todo el ciclo de vida del proyecto.

## 5. Anexos

A continuación, se enumeran los documentos complementarios que forman parte del proyecto SportZone. Estos anexos contienen información adicional y detallada que respalda distintas secciones del plan.

- Glosario - SportZone
- Puntos de Función - SportZone
- Lista de Riesgos - SportZone
- Especificación de Requerimientos del Software - SportZone
- Estructuras de Tablas y Modelado de Datos - SportZone
- WBS - Gráfico - SportZone


©SportZone 5/8/25
